

CAHIER DES CHARGES

Nom du projet	Ti Baleine App
Client / Maître d'ouvrage	Ti Baleine Corp
Rédacteur du document	200ping
Date de rédaction	11/08/2026
Version	V2.0
Destinataires	Ti Baleine Corp
Sources	compte-rendu-entretien-01.md, compte-rendu-entretien-02.md

Sommaire

Sommaire.....	2
1. Contexte et objectifs du projet.....	3
1.1 Présentation.....	3
1.2 Origine du projet.....	3
1.3 Objectifs.....	3
1.4 Enjeux.....	4
2. Présentation de l'existant.....	4
2.1 Système actuel.....	4
2.2 Environnement technique.....	4
3. Périmètre du projet.....	4
3.1 Inclus.....	4
3.2 Exclu.....	5
4. Besoins fonctionnels.....	5
5. Besoins non fonctionnels.....	7
5.1 Performance.....	7
5.2 Sécurité.....	7
5.3 Ergonomie et accessibilité.....	7
5.4 Compatibilité.....	7
6. Contraintes du projet.....	7
6.1 Techniques.....	7
6.2 Budgétaires.....	7
6.3 Délais.....	7
6.4 Réglementaires.....	7
7. Livrables attendus.....	8
8. Planning et jalons.....	8
9. Budget.....	9
10. Questions restées ouvertes.....	10

1. Contexte et objectifs du projet

1.1 Présentation

Entreprise Ti Baleine qui organise des sorties baleine et dauphin et possibilité de privatisation pour d'éventuelles autres types de sorties. L'entreprise dispose de deux bateaux de 12 et 24 places. C'est une petite entreprise composée du patron, d'un naturaliste et de deux skippers. Les horaires sont tous les jours de la semaine. Les clients cibles sont les touristes et les locaux.

1.2 Origine du projet

Le projet est lancé pour répondre à la problématique de la complexité pour son entrepreneur de gérer les réservations clients. Qui, actuellement, passe par l'intermédiaire de Whatsapp pour fonctionner et réserver. La solution, une interface capable de tout faire en ligne, permettant aux clients de réserver en ligne et supprimer cette dépendance.

1.3 Objectifs

Objectif principal

L'objectif principal est de permettre à l'entreprise d'organiser les sorties de manière plus encadrée et de simplifier la communication client/entreprise.

Objectifs secondaires

Fluidifier et améliorer la gestion des réservations clients, de même pour leur modification et annulation, la qualité du service client en proposant une toute nouvelle manière de réserver et également organisationnel pour l'équipe.

Résultats attendus

Ce projet répond sur plusieurs niveaux :

- Diminuer la charge de travail des équipes pour l'organisation (Tout fonctionne par Whatsapp)
- Fortifier et améliorer la vision de l'entreprise pour la clientèle
- Amélioration de l'expérience utilisateur par la réservation en ligne, simple et sécurisée

1.4 Enjeux

Les enjeux sont de meilleurs chiffres d'affaires potentiels pour l'entreprise, un accès plus facile aux informations pour les employés grâce à la nouvelle solution et une meilleure organisation.

2. Présentation de l'existant

2.1 Système actuel

Le système actuel fait utilisation Whatsapp, la réservation, la communication entre les clients/équipe, la planification, les réservations et le paiement en présentiel. Ce système possède plusieurs problèmes sur le plan organisationnel et matériel.

2.2 Environnement technique

Aucune infrastructures existantes. Les technologies vont être choisies par l'équipe en fonction des enjeux et contraintes du projet. Le projet nécessitant d'être hébergé sur le web, un choix de stack sera fait selon les meilleures propositions.

2.3 Utilisateurs concernés

La solution concerne le patron, ses employés et leurs clients.

Le patron a un accès complet sur la gestion des réservations, en revanche les employés peuvent consulter uniquement ces réservations.

Les clients peuvent réserver leurs créneaux et les consulter.

3. Périmètre du projet

3.1 Inclus

Inscription (client)

Connexion (client et entreprise)

Faire une réservation (client)

Consultation de sa réservation (client)

Consultations des réservations (entreprise)

Demande d'annulation (client)

Paieement en ligne (client)

3.2 Exclu

Ce qui est hors périmètre pour le projet :

- Affichage en temps réel de la météo
- Système d'avoir client pour réservation
- Remboursement direct
- Réglementations de sécurité
- Paiement en espèce, chèque, différé

4. Besoins fonctionnels

Réservation	Essentielle
Inscription	Essentielle
Connexion	Essentielle
Consultation de sa réservation	Essentielle
Consultation des réservations	Essentielle
Paielement en ligne	Essentielle
Demande d'annulation	Souhaitable

Les différentes règles métier sont :

Demande de réservation → attente de validation → confirmation → paiement
↳ refus

Inscription (au moment de la réservation) → validation des données → création du compte →
Notification par mail ↳ invalide

Connexion → Vérification des rôles → Accès à la vue concernée (client, salarié ou patron)

Demande d'annulation → Envoi du motif + échange potentiel -> Rendez-vous annulé

Modification de la réservation (uniquement lorsque demande en attente) → Confirmation →
Paielement

Pour la validation des données lors de la réservation :

- Nom, prénom, email, numéro de téléphone, type de réservation, nombre de personne (adulte, enfant), date de réservation

Pour l'inscription

- Mot de passe

Le parcours client est :

Réservation/Inscription → Connexion → Consulter, modifier, annuler sa réservation ou faire une nouvelle réservation

Le parcours patron est :

Connexion → Consultation des réservations → Confirmation, refus ou annulation d'une demande

Le parcours employé est :

Connexion → Consultations des réservations

Le parcours général :

Page d'accueil avec message de bienvenue, calendrier avec créneaux, nombre de places et type de réservation disponibles. Au clic sur le bouton réserver, apparition du formulaire de réservation. A la fin de la réservation, message de confirmation sur le site ainsi qu'un email de confirmation. Dans ce mail de confirmation avec les informations de la réservation, lien permettant de créer un compte client en renseignant le mot de passe (optionnel). Si une modification ou une annulation devait avoir lieu, le client peut accéder à son compte client pour effectuer l'action.

5. Besoins non fonctionnels

5.1 Performance

5.2 Sécurité

5.3 Ergonomie et accessibilité

Pas de charte graphique déterminée au moment de la rédaction de ce cahier des charges.

5.4 Compatibilité

6. Contraintes du projet

6.1 Techniques

Le client souhaite que la solution soit accessible sur leurs ordinateurs et sur tout type d'appareil pour leurs propres clients. La solution envisagée est un site web responsive.

6.2 Budgétaires

Pas de budget déterminé.

6.3 Délais

Fin de projet: 21/08/2026

6.4 Réglementaires

7. Livrables attendus

8. Planning et jalons

Complétez les grandes étapes et dates clés du projet :

Jalon / Livrable	Date prévisionnelle	Responsable
	[JJ/MM/AAAA]	[Nom]
[...]	[JJ/MM/AAAA]	[Nom]
[...]	[JJ/MM/AAAA]	[Nom]
[...]	[JJ/MM/AAAA]	[Nom]

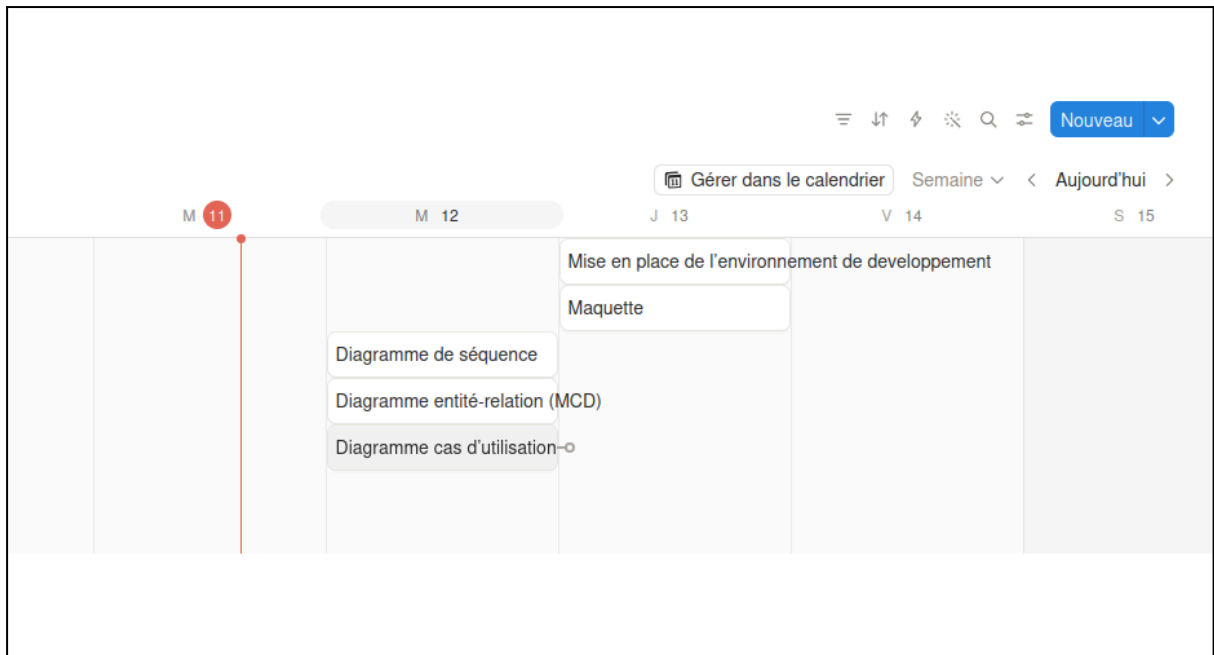


Diagramme de gantt

9. Budget

Pas de budget déterminé.

10. Questions restées ouvertes

#	Question	Posée le	Réponse	Hypothèse retenue en attendant
1	Les types de sorties sont-ils définis en avance en fonction du jour ?	12/08/2026		Non, ils ne sont pas définis en avance.
	Possibilité d'avoir deux sorties baleines la matinée ? (Superposition des horaires de 30min pour 7h/10h)			D'après les calculs, non
